# ÉVALUATIONS A POSTE RIORI DES PROJETS FINANCÉS PAR LE

Remerciements

remercie Mme Maritza GALLARDO et Mme

Victoria ARGUETA ainsi que tous
avec dévou

# Table des matières


EXECUTIVE SUMMARY ..... 1

RÉSUMÉ EXÉCUTIF ..... 5

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE DU PROJET ..... 10

(i) Présentation du projet et objectifs de l'évaluation ..... 10

(ii) Méthodologie de l'évaluation ..... 10

(iii) Contexte du projet ..... 11

(iv) Le public cible du projet : critères de choix ..... 12

(v) Autres initiatives dans le domaine ..... 12

II. OBJECTIFS, STRATÉGIE ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET ..... 13

(i) Objectifs et stratégie du projet ..... 13

(ii) Approche stratégique du projet ..... 14

III. QUESTIONS D'ÉVALUATION ET CONSTATS ..... 15

(i) Pertinence ..... 15

(ii) Efficience ..... 16

(iii) Efficacité ..... 18

(iv) Impact ..... 20

(v) Durabilité ..... 22

(vi) Valeur ajoutée ..... 23

IV. CONCLUSIONS ..... 24

V. RECOMMANDATIONS ..... 27

VI. ÉVALUATION GLOBALE ET OBSERVATIONS FINALES ..... 29

VII. LIMITES, CONTRAINTES ET RÉSERVES ..... 29

VIII. ANNEXES ..... 30

(i) ANNEXE 1 - Détails des questions d'évaluation ..... 30

(ii) ANNEXE 2 – Documentation consultée ..... 32

(iii) ANNEXE 3 – Liste des personnes interviewées ..... 34

(iv) ANNEXE 4 – Agenda de la mission ..... 36

(v) ANNEXE 5 – Liste des sigles et abréviations ..... 38

(vi) ANNEXE 6 – Projets de la coopération bilatérale et multilatérale appuyant l'intégration de l'approche genre dans les projets ..... 40

significant factors: (i) the Coup d'Etat (June 2009) prevented completion of certain activities, which therefore had to be adjusted; and (ii) significant fraud perpetrated by one of the partner organisations[5]. The latter organisation therefore had to be excluded from the project. Thanks to the solvency of the beneficiary organisation in the contract, this organisation was able to

- The implementation of the project benefited from a well-developed logic of intervention that was coherent with the strategic options used for the project. The methodological approach was well designed and included the development of training modules (Advocacy School), radio programmes, methodological tools (monitoring) and relevant systematisation.

- Some challenges that will need to be met in the future are identified, particularly as

suffisamment présente. genre » de
manière transversale dans les trois résultats.
G ¶ H I I L F L H Q F H une très bonne cohérence entre le

facteurs importants qui a empêché la réalisation de certaines
activités qui ont dû être réadaptées et (ii) un problème de fraude important commis par une
des organisations partenaires[11]. Celle-ci a, par conséquent, été exclue du projet. Grâce à sa
faire
face à ces situations. Elle a financé de ses fonds propres le montant équivalent à la fraude
r

renforcement des capacités à ses partenaires, aussi bien dans les domaines financier et technique, que dans la gestion des ressources humaines.

efficacité du projet, plusieurs observations sont à signaler. Lors du démarrage du projet, les indicateurs de la situation de référence ont été identifiés pour

que le projet a globalement réalisé les activités prévues et atteint les résultats escomptés (surtout les R1 et R2), et partiellement atteint
objectif spécifique était trop ambitieux pour être totalement atteint, surtout au vu des contraintes liées aux changements du contexte politique durant la première année

Pour le Résultat 1, les acquis du projet ont certainement contribué à : (i) fournir des informations sur des situations de discrimination d
justice ; (ii) fournir une meilleure connaissance des droits des femmes et des procédures et services pour se défendre; (iii) d
de participation des femmes à la vie publique et politique (suite au
de la participation des femmes aux élections de
Parmi les difficultés rencontrées, le programme national de radio a dû être arrêté suite au
à cet obstacle, le
programme a été organisé au niveau local, à travers un réseau de radios alternatives communautaires.

impact du projet, on constate des effets remarquables au niveau du renforcement des capacités des femmes et des organisations émergentes intégrées par des femmes vivant en milieu rural et appartenant aux communautés indigènes. Les femmes ont vraiment saisi ce projet comme une opportunité pour renforcer leurs capacités

porteuses orientées vers les groupes plus vulnérables, surtout dans les villages éloignés des
rès positive des femmes vis-à-vis des expériences et apprentissages vécus. De plus, le projet a également contribué à rendre visibles les droits des femmes et les situations de violation et de non respect de ces droits. Au niveau des intervention, on observe une plus grande représentativité des femmes dans les instances décisionnelles notamment dans le Réseau

du projet dans le renforcement des capacités institutionnelles et techniques des organisations partenaires.

En ce qui concerne la durabilité ancrage social influent et respecté ainsi que la OXFAM a le souci de garantir les effets durables du projet sur les groupes cibles, et veille à assurer la pérennité des résultats aussi bien au niveau des organisations partenaires (notamment sur les plans institutionnel et technique) que des groupes bénéficiaires finaux (les femmes). Parmi les facteurs significatifs de durabilité, on peut citer : (i) le renforcement institutionnel des organisations partenaires portant sur leurs capacités stratégiques, leurs
leur gestion administrative et financière, etc. ; (ii) la

### *(iii) Contexte du projet*

ayant une superficie de 112 090 km$^2$ et compo [13]. Le revenu moyen des habitants est moyennement bas et le produit national brut interne est estimé à $1,547[14] en 2008. La distribution des revenus et des opportunités place 65 % des foyers sous la ligne de pauvreté, et 47% des foyers vivent en extrême pauvreté. La stratification par âge montre une population jeune, puisque 60 % de la population a moins de 25 ans.

### *(iv) Le public cible du projet : critères de choix*

pauvreté et vulnérabilité. Un nombre important parmi elles appartient à la communauté t aux . Leurs opportunités de formation et de participation aux processus politiques et aux postes de prise de décision sont très faibles.

group
sensibilisation et de formation. 2000 enseignants et jeunes, filles et garçons étudiants de

### *(ii) Approche stratégique du projet*

r les droits de femmes et les situations de non-respect de ces droits (particulièrement au travers des médias et campagnes) ; (ii) des études et recherches pour mieux connaî
les besoins spécifiques des 1 0 0 Q G H

critères-
ou

les sous-questions appliquées.

### *(i) Pertinence*

Les entretiens et visites du terrain ont permis de constater plusieurs facteurs de pertinence :

- Dans un contexte où les politiques publiques sont caractérisées par une faible capacité d'exécution à cause de la conjoncture actuelle, le projet apporte un regard et un espace à partir de la société civile sur les politiques destinées aux populations vivant en extrême pauvreté et en faveur de l'équité et l'inclusion sociale. Le projet

  la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (2001-2015) ainsi que dans le Document « Visión de País 2010-2038 y el Plan de Nación 2010-2022 » qui prennent

  de genre. En outre, le projet est pertinent par rapport à la Politique Nationale de la Femme, qui a été définie dans le Premier Plan National d'Egalité d'Opportunités 2002-2007 et dans le second Plan de d'Egalité et Equité Genre 2010-2022 ;

- Les quatre composantes de ***la stratégie poursuivie*** par le projet sont bien articulées et complémentaires [24] structurée en huit modules de formation qui ont été préalablement testés et adaptés
  ion aussi bien au niveau national que local ; (iii) la
  ; (iv)

-
  politiques pour les Réseaux des Femmes au niveau des municipalités. Ces quatre éléments sont particulièrement adéquats avec les options stratégiques du projet et surtout

  groupes cibles ; ce qui fait preuve de la pertinence de la démarche stratégique choisie.

  démarche de partenariat, les évaluateurs estiment que la

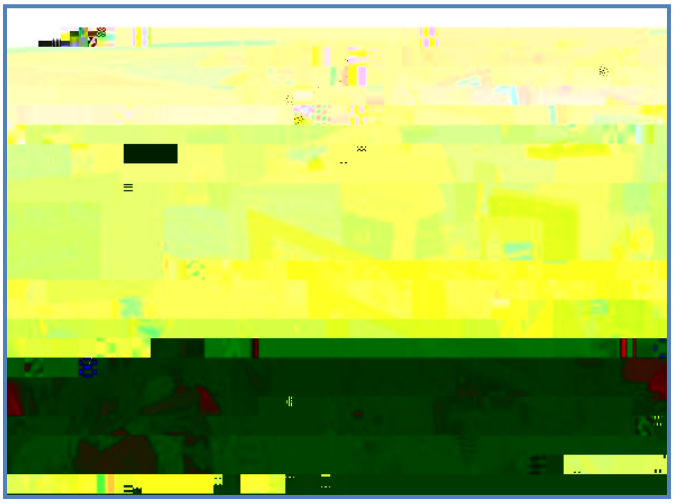

; (ii) elle a déboursé de

planifiées initialement.

importantes pour renforcer leur système de suivi financier. Ainsi, dans le futur, plutôt que

pour optimiser la transparence dans la gestion et éviter la double utilisation des mêmes factures comme pièces justificatives des dépenses réalisées dans le contexte de projets différents.

*:* étant donné que le projet est exécuté en partenariat,

prévu plusieurs mesures pour assurer une

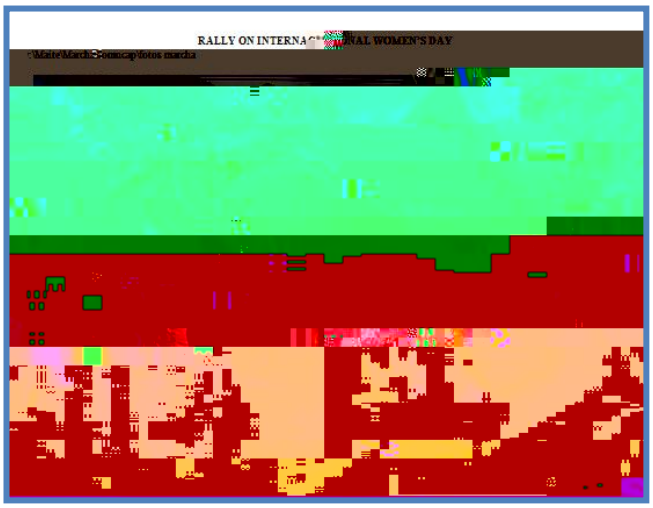

### *(iii) Efficacité*

Quant à la systématisation des expériences, le projet a réussi à publier un document de référence contenant les bonnes
organisations partenaires. Néanmoins, la contribution aurait été plus efficace si cette démarche de systématisation avait été menée de manière conjointe par les quatre organisations partenaires, c'est-à-dire si les analyses et enseignements identifiés pour chaque organisation avaient été traités de manière collective et croisée. Cela aurait permis

des capac

### R3 - 5HQIRUFHU O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ GHV 3RLQWV ) municipalités

Ce résultat visait principalement à renforcer l
organisation et à légitimer des lieux de participation. Le résultat le plus avancé est

les prése
auto assistance »[27] de femmes, accompagnées par des animatrices, ont préparé des audits sociaux et élaboré sur base des observations recueillies
politique des femmes pour chacune des trois municipalités. Pour ce faire, elles ont identifié
e 2% du budget municipal des OMM
pour des femmes.
Dans chaque municipalité, le réseau des femmes a réalisé des activités auprès des autorités locales (des réunions des Conseil Municipal « Cabildos abiertos », des rencontres et

etc.). Ces activités visaient à construire un climat de bonne gouvernance (dans les municipalités) et de contribuer à la citoyenneté (chez les femmes).

e formulation des
agendas politiques. Provoquées par la situation politique, les divergences entre le

favorisé une meilleure participation des femmes dans les espaces publics. Néanmoins, les
restent incertaines au sujet de
de la légitimité des articulations entre les org des V S D U W LU R D3G0 a %eå5“7=ã8E 5T_umå =ã“ -æ

appartenant aux communautés indigènes. Le projet a également eu des impacts considérables sur les zones géographiques
partenaires. En ce qui concerne O ¶ L P S D F W G X S U R M H W femmes leaders, E p Q p I L F L
organisations de base et réseaux des femmes, les entretiens et visites des zones
:

- Les femmes ont vraiment saisi ce projet comme une opportunité pour renforcer leur

  orientées vers les groupes plus vulnérables, surtout dans les villages éloignés des villes.
- Les femmes ont réaffirmé avoir gagné de la confiance en elles-mêmes et une meilleure estime pers
  conviction sont véritablement renforcées.
- Concrètement, leur participation aux programmes de radio est devenue très active. Avec unication
  offerts dans le programme, il y a eu une augmentation des plaintes portant sur abus sexuels, de violence physique et psychologique, féminicides, etc. Petit à petit, des initiatives pour prendre contact avec les instances et opérateurs de la justice (fiscale, police, avocats, juges, etc.) ont été observées.
- Plusieurs femmes participent dans la prise des décisions au niveau communautaire, les
  associations de parents, le volontariat de santé, etc. Elles font partie du Réseau des Femmes auprès des municipalités et participent aux processus de monitoring social (audit social).

Quant à O ¶ L P S D F W G X S U R M H W V X U O H V
, celles-ci valorisent

projet :004800570003>-985<005600580050057007O>.Tm [2* Q -176F14 11.04 Tf 1 0 0 1 92.184 520.51



004800570003>-985<005600580050057007O>.Tm [2*7500330 Tm 4 11.04 Tf 1 0 0 1 92.184 520.51 Tm [(-)] T( 6(e)330

«

programmes de formation (modules EIP), agendas politiques qui ont été élaborés dans le cadre du projet et présentés auprès des autorités locales. Les acteurs . Ils es initiatives similaires dans le futur.

- La systématisation des résultats relatifs aux expériences de leadership et de participation des femmes.

Le projet a ainsi réussi à renforcer certaines composantes importantes de durabilité, notamment au niveau institutionnel et technique.
Néanmoins, les organisations partenaires ainsi que les organisations de base et les réseaux des femmes au niveau local ne disposent pas

durabilité financière. La stabilité du personnel est peu assurée, dépendant de la disponibilité des ressources. Le Programme radio était interrompu par manque de ressources, donc on peut remarquer du projet et de la distribution de fonds, certaines activités ne pourront plus continuer.
On peut noter également que le prévu de manière explicite une concertation avec les initiatives/programmes menés par

bailleurs de fonds autour des domaines . Il reste à consoli participation des femmes. Pour le moment, ces initiatives ne sont pas toujours légitimées, ce qui les place dans une certaine vulnérabilité. Leur durabilité dépend de la volonté des autorités en vigueur.

### *(vi) Valeur ajoutée*

Selon
appuyé par FNUD a apporté une valeur ajoutée sur trois niveaux :

- Il a fourni un renforcement institutionnel significatif donnant du potentiel à des pr

situation de référence et des indicateurs objectivement vérifiables spécifiques. Cet exercice est un apprentissage nouveau, nécessaire dans la formulation des futurs projets et surtout au niveau du suivi et de la capitalisation des actions ; ce qui est fortement valorisé par OXFAM.

- Les organisations partenaires ont vu renforcer leurs approches stratégique et genre ». Elles ont développé un leadership inclusif et participatif accordant aux femmes dans les organisations de base et les communautés indigènes bénéficiaires des opportunités et des apprentissages de participation.

Ces développements et renforcements au niveau des organisations ont eu un impact direct mes au niveau local. Le projet a ainsi contribué à créer un cadre de sensibilisation sur la condition de

à faire, un processus de conscientisation est déclenché.

$FWLRQ GDQV OH FDGUH GH OD &DPSD\RXU OLH´

## IV. Conclusions

***(i)*** 5HFRQQDLVVDQFH G¶2;)$0 HW VHV SDUWHQDLUHV SRX***les droits des femmes et leur importante coordination***

Un
domaines thématiques et géographiques des interventions des organisations partenaires OXFAM reflète sa volonté de promouvoir une approche stratégique collective, axée sur des alliances et synergies interinstitutionnelles et motivant les acteurs à dépasser une logique de « réaliser son propre agenda pour une plus grande visibilité de son organisation ». Cette démarche ,
et marqué par des dynamiques sociales teintées de résistance et de méfiance. Cependant, on observe que

défendre et exercer leurs droits et de leur accorder une place de participation politique privilégiée.

***(iii) Renforcement des capacités de leadership des acteurs de la société***

F L Y L O H H Q I D Y H X U G H O D S U R P R W L R Q G ¶ X Q H F L W R \ H
G ¶ X Q H O p J L W L P L W p G H V U p V H D X [ G H V I H P P H V D X S U
***société***

ascendante (***b*** ***-p*** *)* et la mobilisation des acteurs de la société civile, fondamentalement des organisations de base et des réseaux des femmes vivant dans des conditions

us endogènes participatifs impliquant directement les acteurs et organisation et le développement du capital humain. Il a initié les groupes cibles dans une vision nouvelle et stratégique de

questions des femmes

***(iv) Une approche innovatrice dans un contexte fragilisé et peu démocratique***

Le projet a choisi de prioriser ses actions auprès des femmes vivant en situation de grande vulnérabilité dans le milieu rural et les communautés indigènes. Pour ce faire, il a conçu une stratégie spécifique, pertinente et innovante qui place la femme au centre de la démarche

e curriculum développé

organisation des OSC des femmes.

***(v) Une approche méthodologique cohérente et bien structurée***

avec les options stratégiques retenues pour le projet (un objectif spécifique et trois résultats). Des outils pour assurer le monitoring des activités réalisées ont été définis au moment du démarrage du projet. Même si les indicateurs ont porté davantage sur les activités exécutées que sur les résultats atteints, l
déjà u TJ ET Ed [(dé)3(j)-5((e030048058105500 5003>1700480058>3<005731r-4(S)4(C)Pa3r.3<0057>-4



***Une***

***(vii) Défis à relever*** j O ¶ D Y H Q L U

Il nous faut aussi souligner certaines faiblesses qui constituent par la même occasion des défis à relever . Parmi celles-ci, trois aspects importants mais peu travaillés peuvent être signalés :

(i)

constate que la composante de masculinité est pratiquement absente, non seulement en termes quantitatifs[28] mais surtout absente dans la vision stratégique. Dans son approche « genre », le projet met principalement émancipation des femmes, qui est une composante essentielle, mais peu

approche genre : la prise de conscience par les hommes de la condition de la femme dans la société, de son statut

promotion de relations équitables entre hommes et femmes.

(ii) Dans la même ligne de réflexion, on constate aussi une faible présence des jeunes dans le projet (même les filles adolescentes), ils ne sont pas pris en compte comme groupe cible.

## V. Recommandations

Tenant compte des bons résultats globalement atteints par le projet, les recommandations pro

contexte
et socio-économique peu
inclusif pour les femmes.

***(i)*** 7 L U H U G H V O H o R Q V G H O ¶ ( F R O H G ¶ , Q F L G H Q F H 3 R O L W L
Il serait fortement nécessaire de prévoir une phase de suivi comprenant par exemple des « recherches appliquées
différentes expériences réalisées et les progrès atteints, les difficultés et faiblesses rencontrées. ficacité de

percutante. «

droits
devraient donc viser aussi, de manière intégrale et cohérente, à renforcer les capacités des « titulaires de droits » (les femmes) à connaître, défendre et présenter « leurs demandes » mais aussi celles des « titulaires des obligations » à remplir leurs responsabilités de protection.

avec la municipalité suffisamment conséquent (réunions périodiques avec un agenda préétabli, présentation des papiers de position avec les besoins et propositions demandées et des pistes pour leur mise en application, etc.). Cet effort pourrait

espaces et lieux de dialogue utilisés par les femmes pour la présentation de leurs demandes (par exemple « *[illegible]* » ou Conseils municipaux) soient progressivement

actuelle de
un cadre de bonne gouvernance légitimé et durable.

***(iv) Renforcer les es[illegible]***



***ODK PP***

## VI. Évaluation globale et observations finales

processus de promotion de la citoyenneté active des femmes en choisissant la mobilisation des groupes les plus défavorisés et vulnérables, des femmes vivant dans les villages et communautés rurales les plus éloignées. La stratégie retenue par le projet vise à les informer sur leurs droits et à les rendre conscientes sur le fait que leur « participation organisée » est le chemin le plus efficace pour se défendre, pour revendiquer leur condition de femmes dans la société et pour améliorer leurs conditions de vie socioéconomiques.

émancipation des femmes et des réseaux de femmes) être leurs capacités

# VIII. ANNEXES

## ANNEXE 1 - ' p W D L O V G H V T X H V W L R Q V G ¶ p Y D O X D W L R Q

| Critères CAD | 4 X H V W L R Q V G ¶ p | Sous -questions |
|---|---|---|
| Pertinence | Dans quelle mesure le projet re par le bénéficiaire a-t-il répondu aux spécificités du contexte et aux besoins des bénéficiaires aux niveaux local et national? | ƒ Dans quelle mesure les objectifs du projet répondent-ils correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels des groupes bénéficiaires (organisations de la société civile, leaders politiques, femmes et jeunes, etc.)?<br>ƒ Les approches stratégique et méthodologique adoptées sont-elles pertinentes avec le profil des groupes cibles et résultats visés par le projet?<br>ƒ -ils pertinents par rapport aux besoins et réalités des populations bénéficiaires? Le contenu des programmes est-t-il adapté et accessible aux populations bénéficiaires?<br>ƒ Les risques sont-t-ils bien t |

rôle actif des femmes dans
les processus politiques ?

## ANNEXE 2 ±Documentation consultée

- ***Documents de programmation et de gestion du projet :***
  - Document de Formulation du Projet (Contrat), du 21/10/2008 ;
  - Rapport intermédiaire du Projet ;
  - Rapport Final Narratif du Projet ;
  - Rapport financier du Projet.

- ***Matériaux de support et documents élaborés dans le cadre du projet :***

- Participación política y ciudadana de las mujeres en los municipios de La Esperanza e Intibucá, Irías, Kenia, Centro de Estudios de la Mujer de Honduras (CEMH), 2010 ;

- Limitaciones legales, normativas, institucionales y [.es13ion( )3(, )dga|

## ANNEXE 3 ±Liste des personnes interviewées

ƒ 0HPEUHV GH O¶pTXLSH GX 3URMHW

| Nom & Prénom | Responsabilité dans le Projet |
|---|---|
| Martiza Gallardo | Coordinatrice du programme Gouvernance et Justice de genre |
| Maite Matheu | Responsable du projet (UNDEF) |
| Henry Castro | Responsable financier (UNDEF) |

ƒ ***Organisations partenaires du Projet***

| Nom & Prénom | Organisation |
|---|---|
| Gladyz Lanza | Visitación Padilla |
| Merly Aguigure | Visitación Padilla |
| Nidia Molina | COMUCAP |

| | |
|---|---|
| María Cándida Pineda<br>Concepción Domínguez Meza<br>Raimunda Domínguez<br>Juana Domínguez<br>Evelyn Cuellar<br>María Santos Paz | |
| 1. Evelyn Coellar<br>2. Eliana Donaire<br>3. Michelle Aguilar<br>4. María Santos Paz | Personnel responsable |
| Cleotilde Banegas | Coordinatrice de la OMM, La Esperanza |
| Margarita Dejarano | Ex-Coordinatrice de la OMM, La Esperanza |

- ***Acteurs Externes***

| Nom & Prénom | Responsabilité dans le Projet |
|---|---|
| Milbia Hernández | Coordinatrice ACI-ERP |
| Melba Hernández | |

## ANNEXE 4 ±Agenda de la mission

| Fecha / Hora | Lugar | Actividad | Logística | Coparte/ Oxfam |
|---|---|---|---|---|
| 02 de mayo de 2011 | | | | |
| 08:00-09: 00 | Tegucigalpa, Fco. Morazán | Sesión de trabajo de las evaluadoras | Nancy García (Admón. OI-HN) | Oficina Oxfam TGA |
| 09:00 -10:30 | Tegucigalpa, Fco. Morazán | Reunión con Maritza Gallardo Coordinadora Programa Gobernabilidad y Justicia de Género | Nancy García (Admón. OI-HN) | Oficina Oxfam TGA |
| | | Entrevista con Maite Matheu Oficial a cargo del proyectos (2 años) | Nancy García (Admón. OI-HN) | Oficina Oxfam TGA |
| 10:30 | | Traslado de Oxfam a Visitación Padilla | | |
| 11:00-11: 45 | Tegucigalpa, Fco. Morazán | Comisión de Mujeres interpartidarias. Socorro Torres (líder de la comisión) | Nancy García (Admin OI-HN) | Oficina Visitación Padilla |
| 11:45-12:45 | Tegucigalpa, Fco. Morazán | Entrevista con Dina Meza Encargada programas de Radio Movimiento de Mujeres p5.97 592.85.ç | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00-15:00 | Marcala, La Paz | Entrevista con el equipo coordinación y encargadas del proyecto (Nidia Molina y Dalila Aguilar) Dulce Marlen Contreras Coordinadora | Nidia/Vicky-Nancy | Oficina COMUCAP |
| 15:00-16:00 | Marcala, La Paz | Entrevista con Dina Milagro Tome Encargada Programa de Radial | Nidia/Vicky-Nancy | Oficina COMUCAP |
| 16:00 | | Traslado a la Alcaldía Municipal | | |
| 16:30-17:15 | Marcala, La Paz | Entrevista con Miriam Pineda vice Alcaldesa de Marcala La Paz. | Nidia/Vicky-Nancy | Oficina Alcalde Marcala, La Paz |
| 04 de mayo de 2011 | | | | |
| 07:00-08: 00 | Marcala, La Paz | Desayuno | Nidia/Vicky-Nancy | Oficina COMUCAP |
| 08:30-09: 00 | Marcala, La Paz | Laura Vásquez ExCaritas /Visión Mundial | Nidia/Vicky-Nancy | Oficina COMUCAP |
| 09:30-10:30 | Marcala, La Paz | GuadalupePaz, Juez, Presidente de la Red de Operadores de Justicia | Nidia/Vicky-Nancy | Oficina COMUCAP |
| 10:30-12:00 | | Traslado de Marcala a La Esperanza | Nidia/Vicky-Nancy | |
| 12:00 -13:30 | La Esperanza | Almuerzo | Vicky-Nancy | |
| 13:30-14:30 | La Esperanza | Grupo Focal con mujeres de la red de Intibucá y la Esperanza (20) | | |

| | |
|---|---|
| UNAH | National Autonomous University of Honduras |
| UNWOMEN/ ONU-Femmes | United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women/ femmes |
| UTRMP | Technical Unit for Reforming the Public Ministry |
| UNDEF/FNUD | United Nations Fund for Democracy/Fonds des Nations Unies pour la Démocratie |
| UNFPA/FNUAP | |

## ANNEXE 6 ± Projets de la coopération bilatérale et multilatérale D S S X \ D Q W O ¶ L Q W p J U D W L R Q G H V S U R F K H V

| Donante | Proyectos | Fecha de finalización |
|---|---|---|
| Agencia Andaluza de Coop. Internac. (AACID) | Proyecto de apoyo al INAM II fase : Fortalecimiento a las oficinas municipales de la mujer :<br>- Redes de Mujeres y/o Comités de Apoyo<br>- Agendas municipales de género<br>- Dotación de<br>- Manuales, directorios y otros recursos<br>- Estrategia de monitoreo y seguimiento<br>- Formación/ Capacitación<br>- Fortalecimiento y mejora del centro de documentación<br>- Expo feria | Enero 2012 |
| Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) | Transversalización de género en :<br>x Apoyo al plan Educación para Todos<br>x Proyecto Agua y Saneamiento III<br>x Apoyo a cooperativas forestales<br>x Promoviendo la seguridad alimentaria en las cuencas de los Ríos Choluteca y Negro<br>x Apoyo al programa de caficultura sostenible del IHCAFE<br>x Remplazando sistemas tradicionales de producción agropecuaria en laderas por sistemas agroforestales con cacao de alto rendimiento<br>x Seguridad alimentaria en la cuenca de Nacaome y Goascorán<br>x Redes comunitarias de salud<br>x Expansión de los programas municipales de infancia y juventud y servicios amigables de salud sexual y reproductiva para jóvenes.<br>x Prevención y control del Chagas y Leishmaniasis | 2011<br>2011<br>2014<br>2014<br>2014<br>2015<br>2015<br>2012<br>2013<br>2015 |
| Agencia Española de Cooperaciòn Internacional para el Desarrollo (AECID) | Programa de apoyo a la ejecución de la Política Nacional de la Mujer en los ejes de prevención de la violencia por razones de género y participación política ciudadana.<br><br>Apoyo a la Política Nacional de la Mujer en el eje de participación política y social y fortalecimiento de capacidades de la Unidad<br><br>Fortalecimiento de la Gobernabilidad democrática local, Incrementar la respuesta para luchar contra la violencia de género y doméstica<br><br>Mesa de género de organismos no gubernamentales españoles (coordinación y seguimiento al financiamiento) | En preparaciòn segunda fase |

| | | |
|---|---|---|
| Cooperación Técnica Alemana (GIZ) | Género del Dicho al Hecho (Tranversalización del tema género en el Sector de la Economía y el Empleo)<br><br>Investigación y análisis de las diferencias entre hombres y mujeres en el sector de la economía y el empleo.<br><br>Estrategia de Género Programa de la Micro y Pequeña Empresa<br><br>Participación en medidas productivas y comunitarias<br><br>Estudio Revisión del Plan de Estudio de la forma inicial de docentes en formación para una propuesta metodológica en los temas transversales en dicho plan de estudios , la elaboración del material didáctico y capacitación. | Diciembre 2010<br><br>Diciembre 2010<br><br>Diciembre 2010<br><br>Diciembre 2010<br><br>Noviembre 2010 |
| ONU Mujeres | Fortaleciendo la Gobernabilidad Democrática a Nivel Local: Iniciativas de Presupuestos Sensibles a Género.<br><br>PAF de género (Proyecto prevención y atención VIH/SIDA con mujeres privadas de libertad, trabajadoras sexuales y grupos de mujeres con VIH) | 2011<br><br>2011 |
| OPS | | |
